Příloha k čj: KRPC-142024-5/ČJ-2022-020706 ze dne 17.7.2023

DIO - OBJÍZDNÉ TRASY

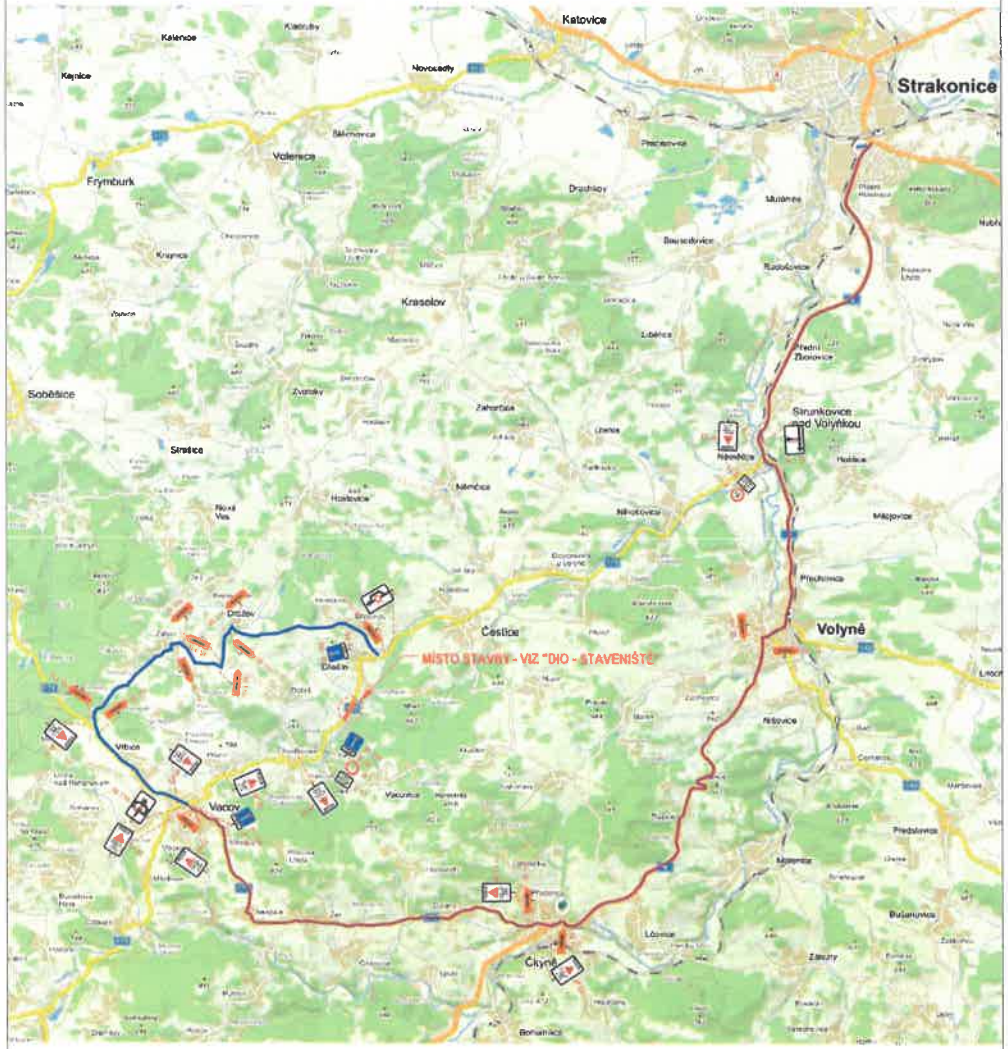

DIO - STAVENIŠTĚ

DIO - OBJÍZDNÉ TRASY

NAVRŽENÁ OBJÍZDNÁ TRASA PRO VOZIDLA DO 8,5 t
PO TÉTO TRASE POVEDE I LINKOVÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

NAVRŽENÁ OBJÍZDNÁ TRASA PRO VOZIDLA NAD 8,5 t

IP 22 NAVRŽENÉ DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DIO - STAVENIŠTĚ

ROZSAH STAVBY

NAVRŽENÉ DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

POZNÁMKA:

Po celou dobu výstavby bude zajištěna bezpečnost podle vyhlášky 398/2009 Sb. "o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb" příloha 2., odstavec 4.1, 4.2, 4.3. Svislé dopravní značky budou v základní velikosti odpovídající TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. Dopravní značky budou ocelové, a fólií tř. R1. Sloupky a stojky DZ budou z Jáklí profilů s přenosným podstavcem.

Po osazení dopravních značek bude rozmístění dopravního značení odsouhlasena s DI Policie ČR. **V němci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu si DI Policie ČR vyhrazuje právo změny, či doplnění dopravního značení.** Vodorovné dopravní značení po dobu výstavby bude svědomitě kontrolováno a v případě nutnosti obnovováno. Dočasné dopravní značení bude na všech dotčených komunikacích po dokončení stavby odstraněno.

Budou dodržovány bezpečnostní předpisy, zejména zákon 308/2008 Sb., a další souvisující předpisy. Bude zajištěno protikolení všech pracovníků o ochraně zdraví při práci a vedení stavby bude dbát, aby tyto zásady byly dodržovány v praxi. Pokud bude v průběhu stavby zjištěno cokoli, co by bylo v rozporu s předpoklady projektu, budou práce zastaveny a projektant neprodleně přizván k rozhodnutí o dalším postupu.

Staveniště zajistí dodavatel stavby po celou dobu výstavby dle platných předpisů tak, aby bylo zabráněno vstupu a zranění nepovolaných osob, dle potřeby bude instalováno cevětlení. Pro přístupy na okolní pozemky budou dle potřeby instalovány přes výkopy provizorní lávky a přejezdy.

ATELIER SIS	Ing. František Strašný - ATELIER S I S, U Malše 20, 370 01 České Budějovice		
	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Strašná Martina	
	VYPRACOVAL	Ing. Strašná Martina	
	KONTROLOVAL	Ing. Strašný František	

Kraj	Jihočeský	Čís. akce	22011
Kat. území	Dřešín	Arch. číslo	22011-11/71
Objednatel	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	Datum	10/2022
Stavba	ZAJIŠTĚNÍ SVAHU SILNICE II/170 DŘEŠÍN (U KOUPALIŠTĚ)	Formát	9x14
		Měřítko	
		Stupeň	DUSP+ZDS/PDPS
		Soupravo	
Příloha	DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	Část	Čís. přílohy
		B.8	2.
